

Møteagenda

- Bypakke Ålesund
- Hva skal vi bygge?
- Status på prosjektet
- Videre fremdrift
- Vinterdrift og trafikkavvikling
- Spørsmål



Bypakke Ålesund



Møre og Romsdal
fylkeskommune



Statens vegvesen



Ålesund
kommune

- Bypakke Ålesund skal gi et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer, og bidra til en attraktiv og bærekraftig byutvikling.
- Fem milliarder kroner skal brukes på å bedre vegene, bygge sykkelveger, gjøre det tryggere for myke trafikanter og legge til rette for økt bruk av buss.

Følg Bypakke Ålesund på nettside og sosiale medier

[Aktuelt](#)[Prosjekt](#)[Kart](#)[Bompengar](#)[Om oss](#)[Kontakt oss](#)[Søk](#)

Bypakke Ålesund

Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløsningar. Bypakke Ålesund skal bidra til betre og tryggare vegar, betre kollektivtilbod og nye sykkelvegar.

[Meir om Bypakke Ålesund](#)

Bypakke Ålesund

1,1 k likerklukk • 2 k følgere

[Innlegg](#)[Om](#)[Reels](#)[Bilder](#)[Videoer](#)[...](#)

Presentasjon

Ålesund skal ruste seg for framtida med miljøvennlige og effektive samferdselsløsningar. Målet er ein betre by for alle. Bypakke Ålesund er eit samarbeid mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen.

Side · Offentlige, kommunale og statlige tjenester

Keiser Wilhelmgate 11, 6003 Ålesund, Norway

70 16 20 00



Bypakke Ålesund

4 t · 🌐


Bur du i Spjelkavika? Vi skal lage klar til ny asfalt. Det blir manuell dirigering i kveld 8. april frå kl. 20.00 og ut natta.

Vi skal lage klar til ny asfalt.

www.bypakkealesund.no



Oppdatert 22.01.2025

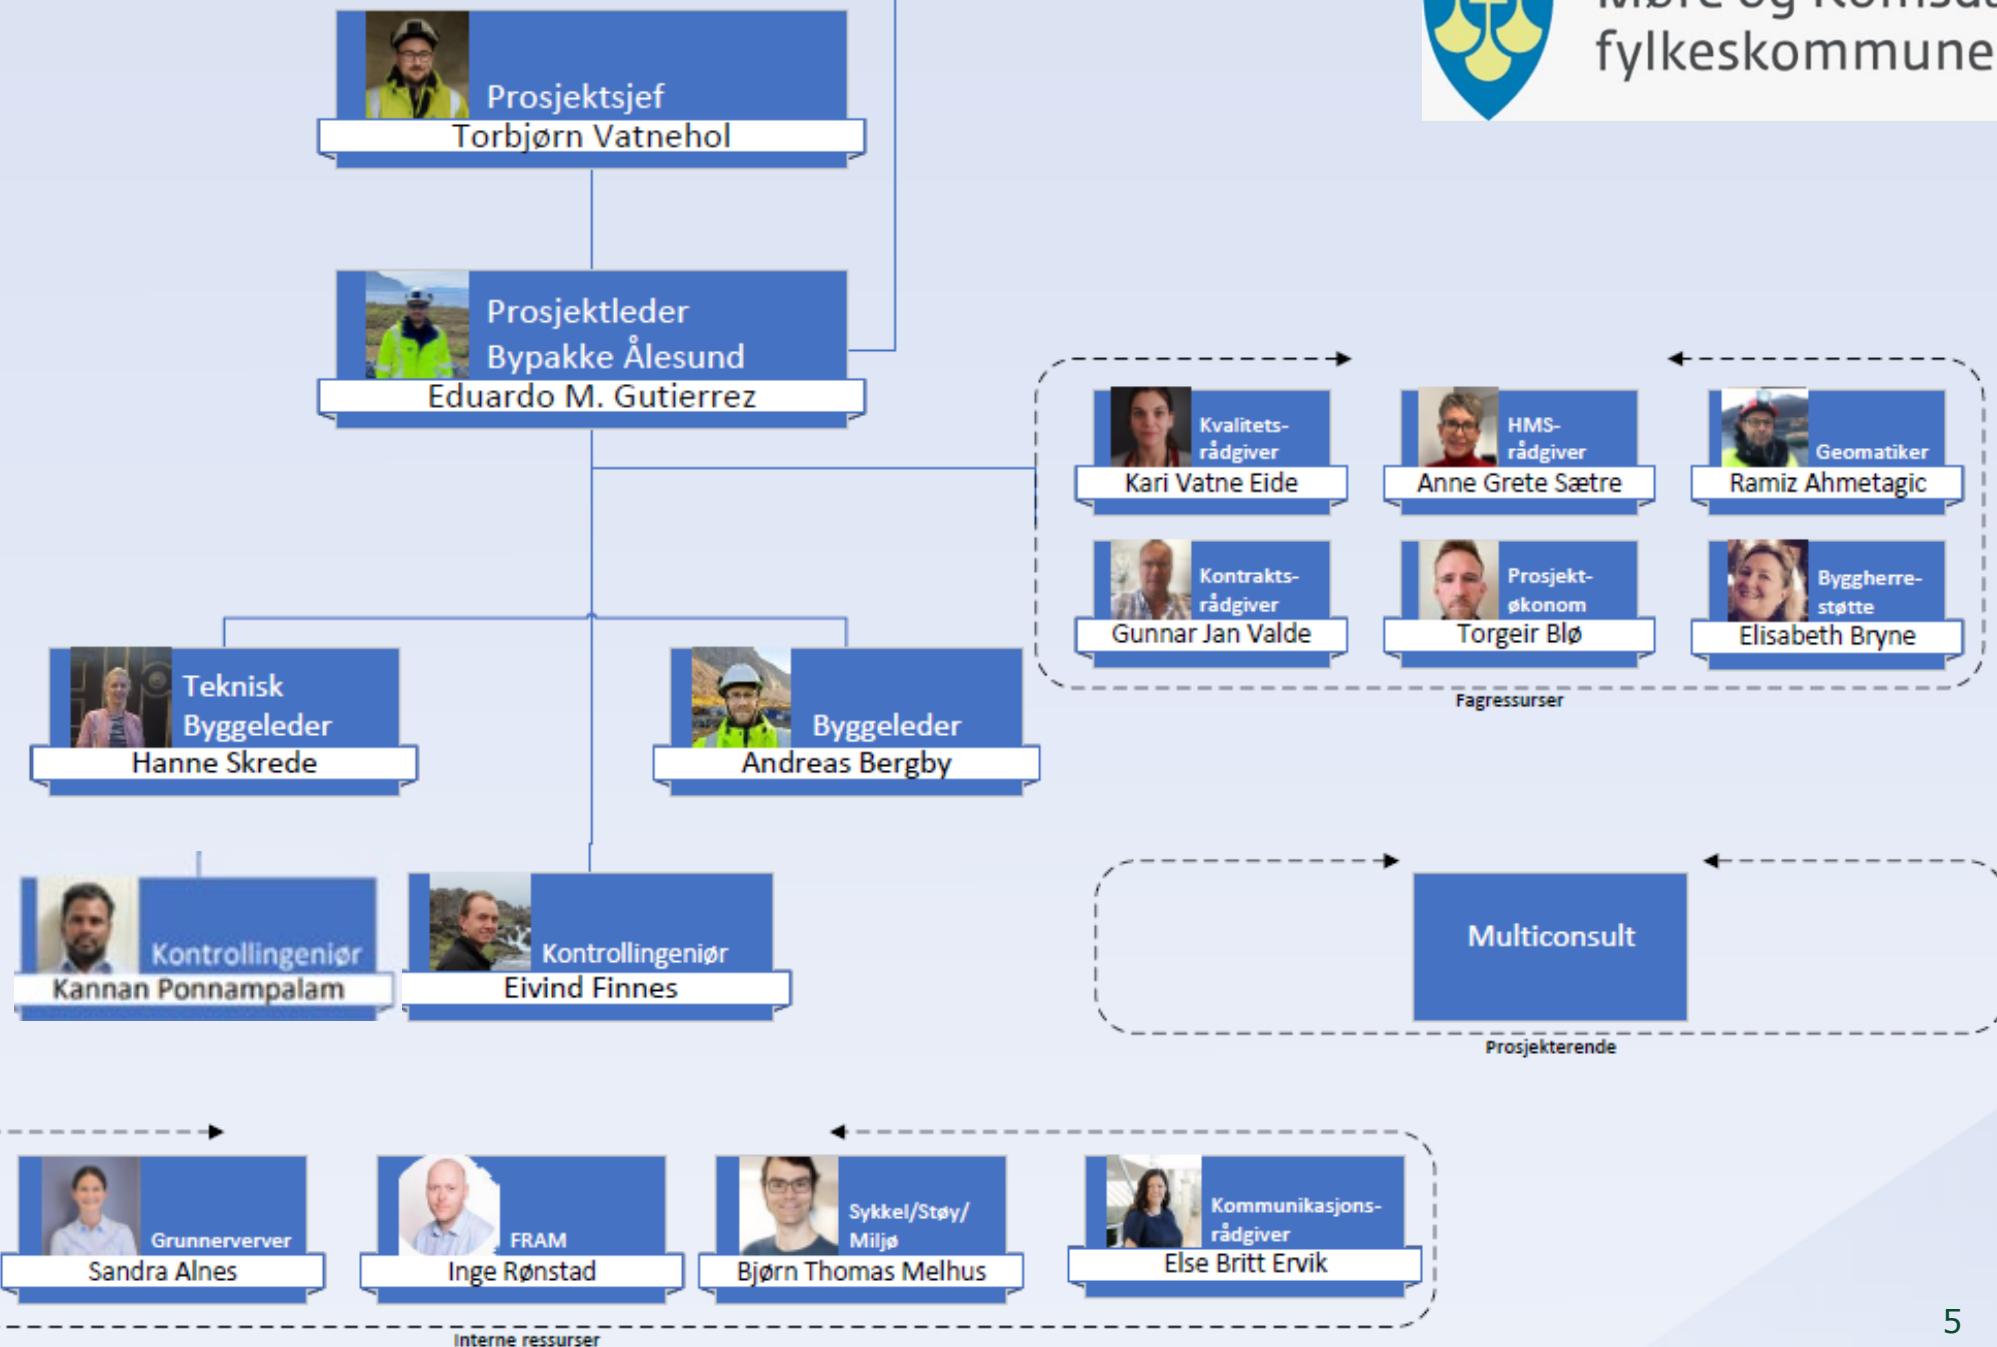

Fv. 60 Blindheim - Flisnes

- **Fjerning av trafikkfarlige kryss**
- **Midtrekkverk på fylkesvegen**
- **Oppgraderer og bygger nye kommunale veger**
- **Støytiltak**
- **Sammenhengende sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen**
- **Trygg kryssing av veger med underganger**



Dyrere enn planlagt

- Forskyving av fase 1:
 - Liggetid på forbelasting Puskhola lengre enn planlagt.
 - Krevende arbeid knyttet til omlegging av høyspentkabler
 - Oversvømmelse sommeren 2024.
- For lite fjell i prosjektet, behov for kjøp av stein eksternt til forbelasting.
- Behov for noe omprosjektering, spesielt med hensyn til eksisterende infrastruktur.

Auka kostnader for vegprosjektet mellom Blindheim–Flisnes

Vegprosjektet i Bypakke Ålesund blir 62 millionar kroner dyrare enn planlagt. Arbeidet er godt i gang, og fylkeskommunen har vurdert tiltak for å redusere kostnadane før styringsgruppa skal ta stilling til vidare finansiering.




Vedtatt endringer

- Ospedalsbakken; Kuttet ut bygging av fortau ca. 100m, avslutning av prosjektet ved krysset mellom Ospedalsbakken og Ospedalsvingen. Vegen asfalteres på nytt.
- Fv. 60 Vest; Korte inn opprustning av fylkesveg for å unngå konflikt med eksisterende gangbru, ca. 150m med veg som kuttes. Gammel busslomme blir fortsatt fjernet.




- Puskholaveg mot nord; Korte inn ca. 60m med veg.
- Nylandbakken; Gjenbruk av eksisterende veg. Vegen får ny vegbelysning og ny asfalt, men dagens geometri beholdes.
- Ramsvika vegen; Gjenbruk av eksisterende veg mot Ramsvika. Vegen får likevel ny vegbelysning og ny asfalt, men dagens bredde beholdes.

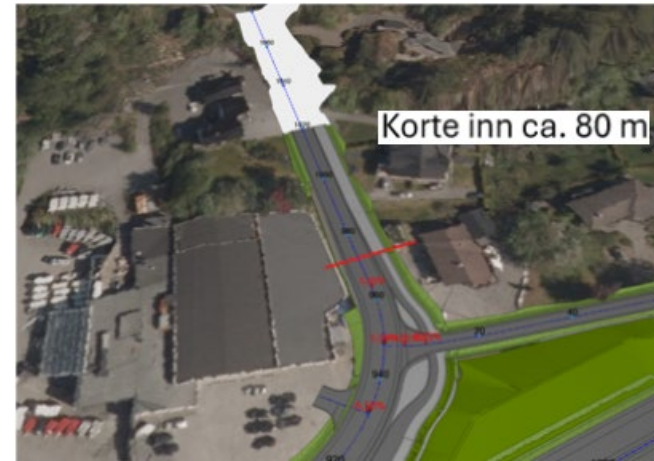

Fv. 60 Blindheim - Flisnes


- ÅDT over 11250
- 1750m ny fylkesveg 60
- 3000m lokalveg m/GSV
- Grunnforsterkning av fylkesveg og kommunaleveg.
- 4 nye underganger, forlenge eksisterende på Flisnes
- 2 elver i kulvert
- Omlegging av eksisterende infrastruktur blant annet hovedvannledning og høyspentkabel (høyspentkabel skal også legges omdidertidig)

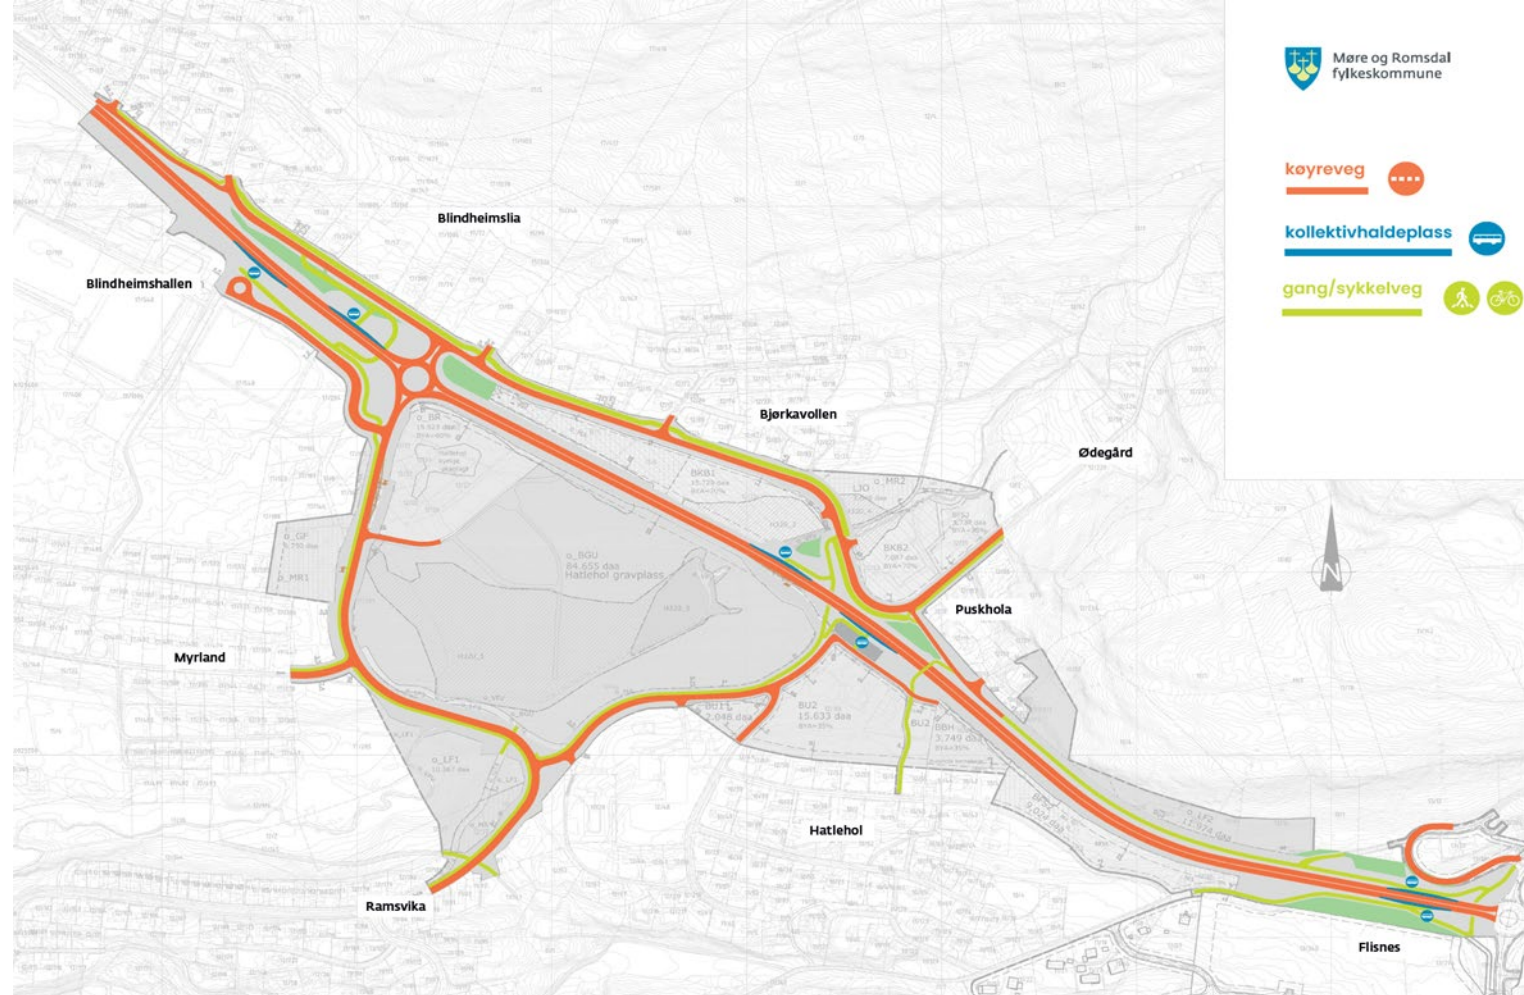

Status om prosjektet

Pr desember 2025

- Fase 1 - ferdigstilt

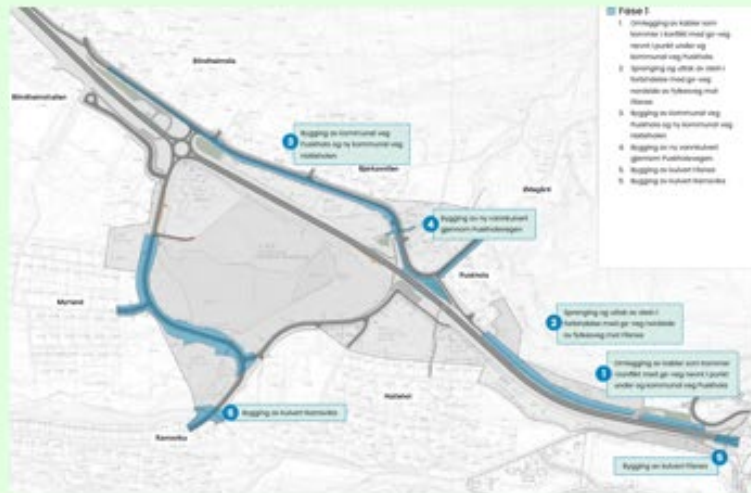

- Fase 2 – i gang frem til vinter 25/26



- Fase 3 – slutfase (vinter 2026)




Fase 2

Mai 2025 - mars 2026

Fase 2

1. Bygging av Puskholevegen mot Ødegård
2. Fortsatt sprenging og uttak av stein i forbindelse med gs-veg nordside av fylkesveg mot Flisnes
3. Masseutskifting Puskhola
4. Bygging av kulvert Puskhola
5. Bygging av nye vannkulverter gjennom FV.
6. Bygging av FV. mellom Puskahola til Blindheimshallen. Inkl. rundkjøring.
7. Bygging av veg til Hatleholen
8. Bygging av veg og gs-veg mot Blindheimshallen
9. Bygging av kulvert Blindheimshallen
10. Bygging av ny vei Eikenosen.

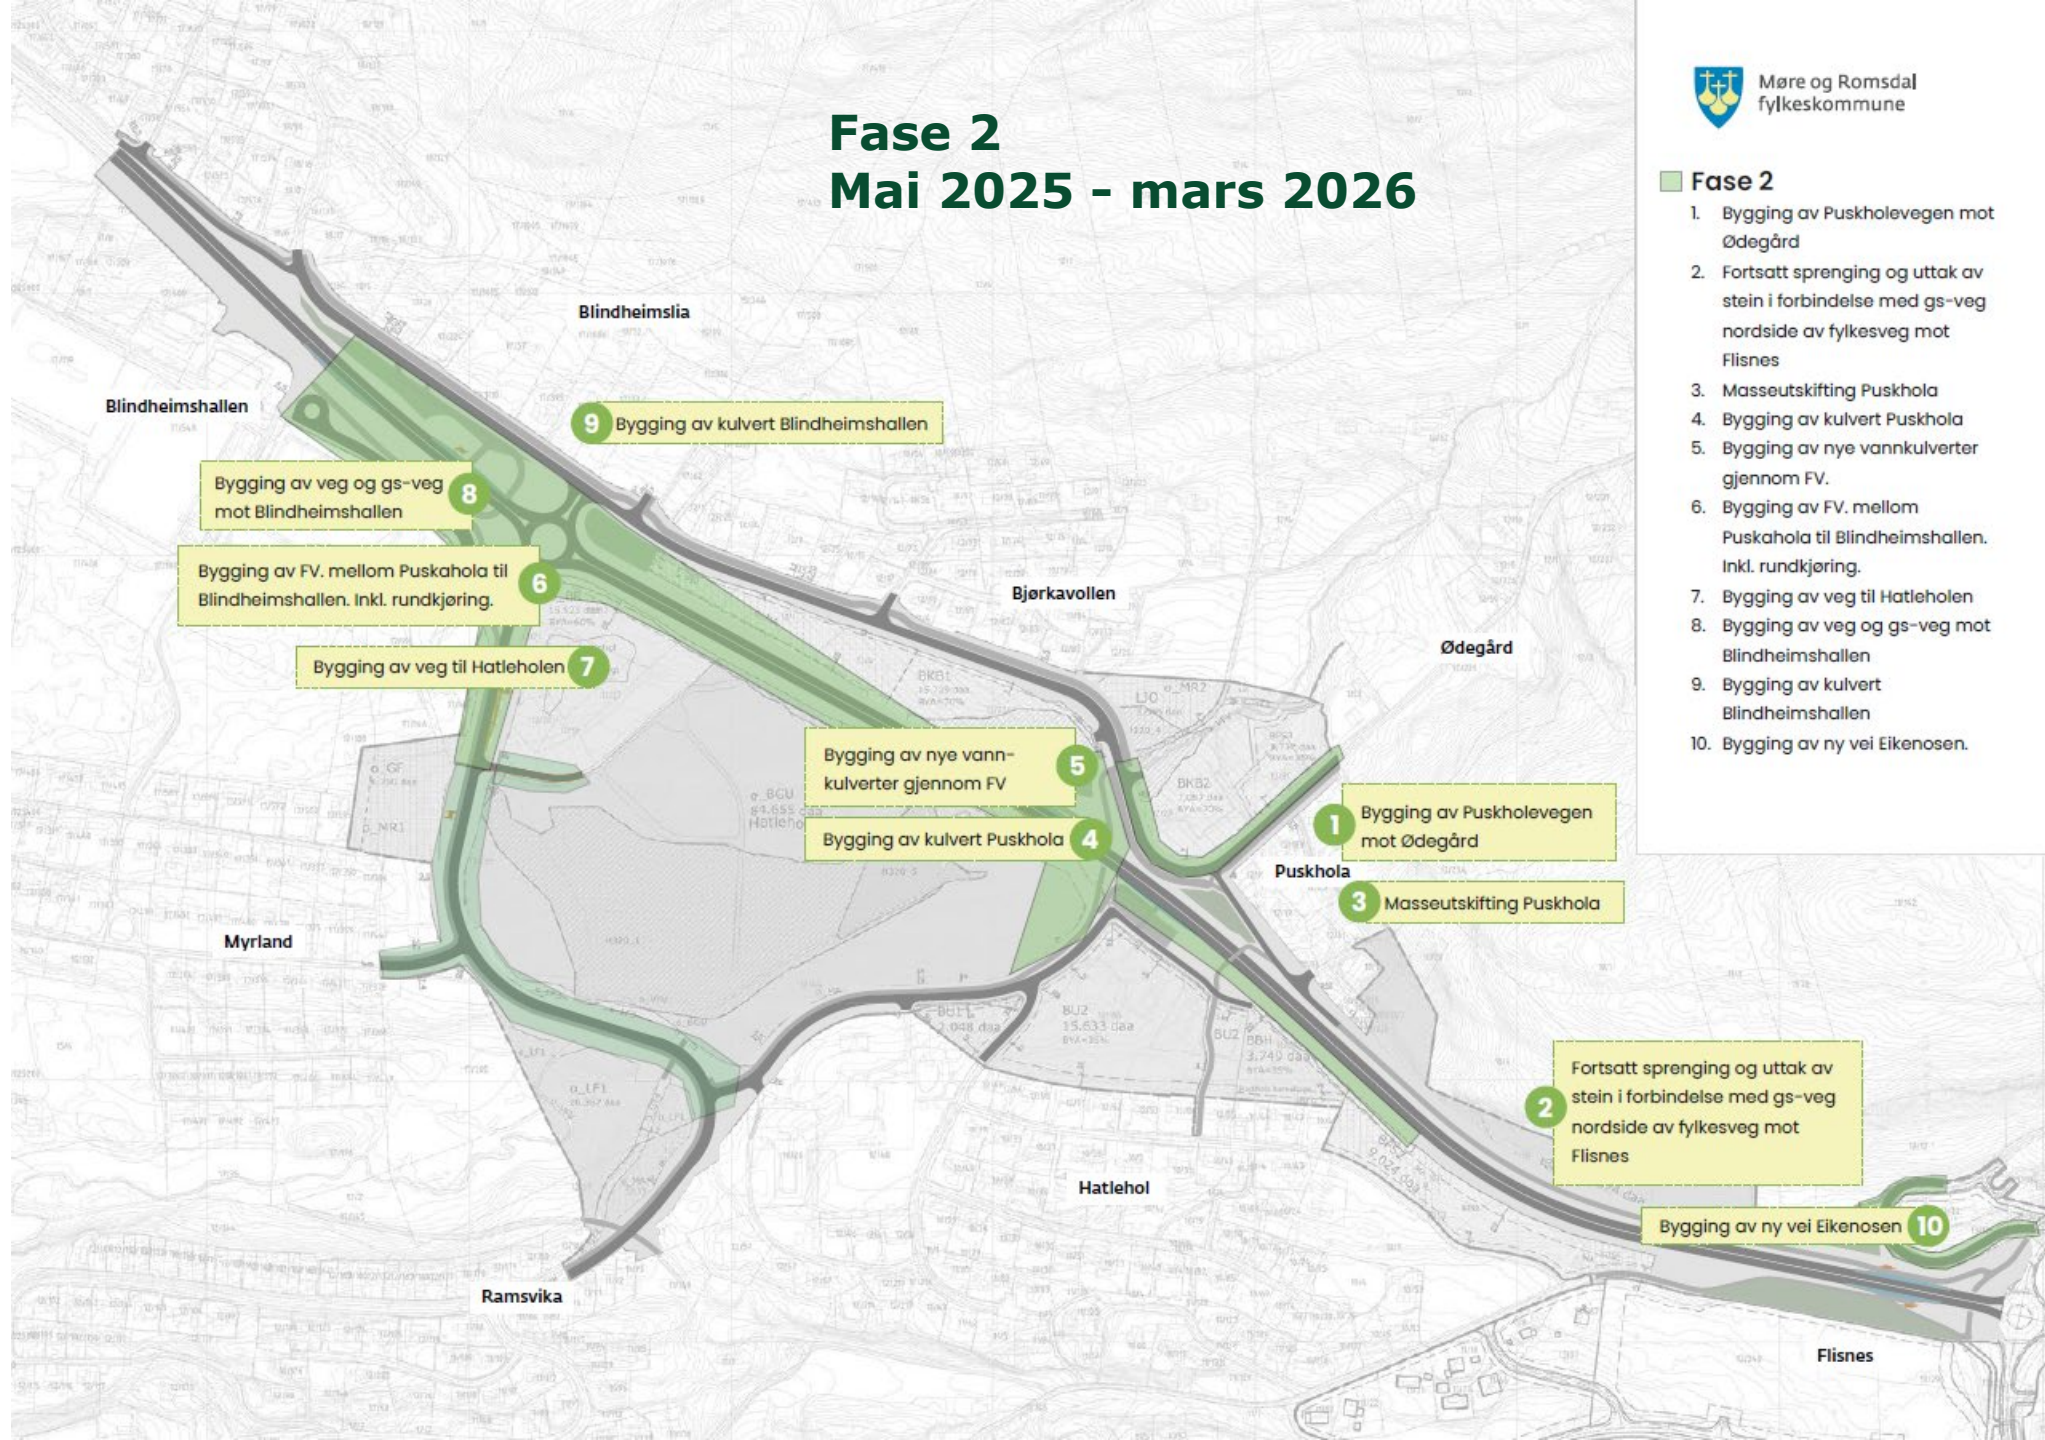





















Planen videre

Fram til fase 3, Mars 2026





1 selected



Change visibility ^







1 selected



Change visibility ^


Planen videre

Fase 3, Mars 2026 og ut prosjektet.

Fase 3

1. Bygging av sykkelvei Puskhola
2. Bygging av siste del av fv. ved Flisnes og etter Blindheimshallen
3. Bygging av Ramvikvegen + busslomme/veier Puskhola
4. Bygging av gangvei eikenosen

**Byggeperiode:
mars 2026 -
vinter 2026**

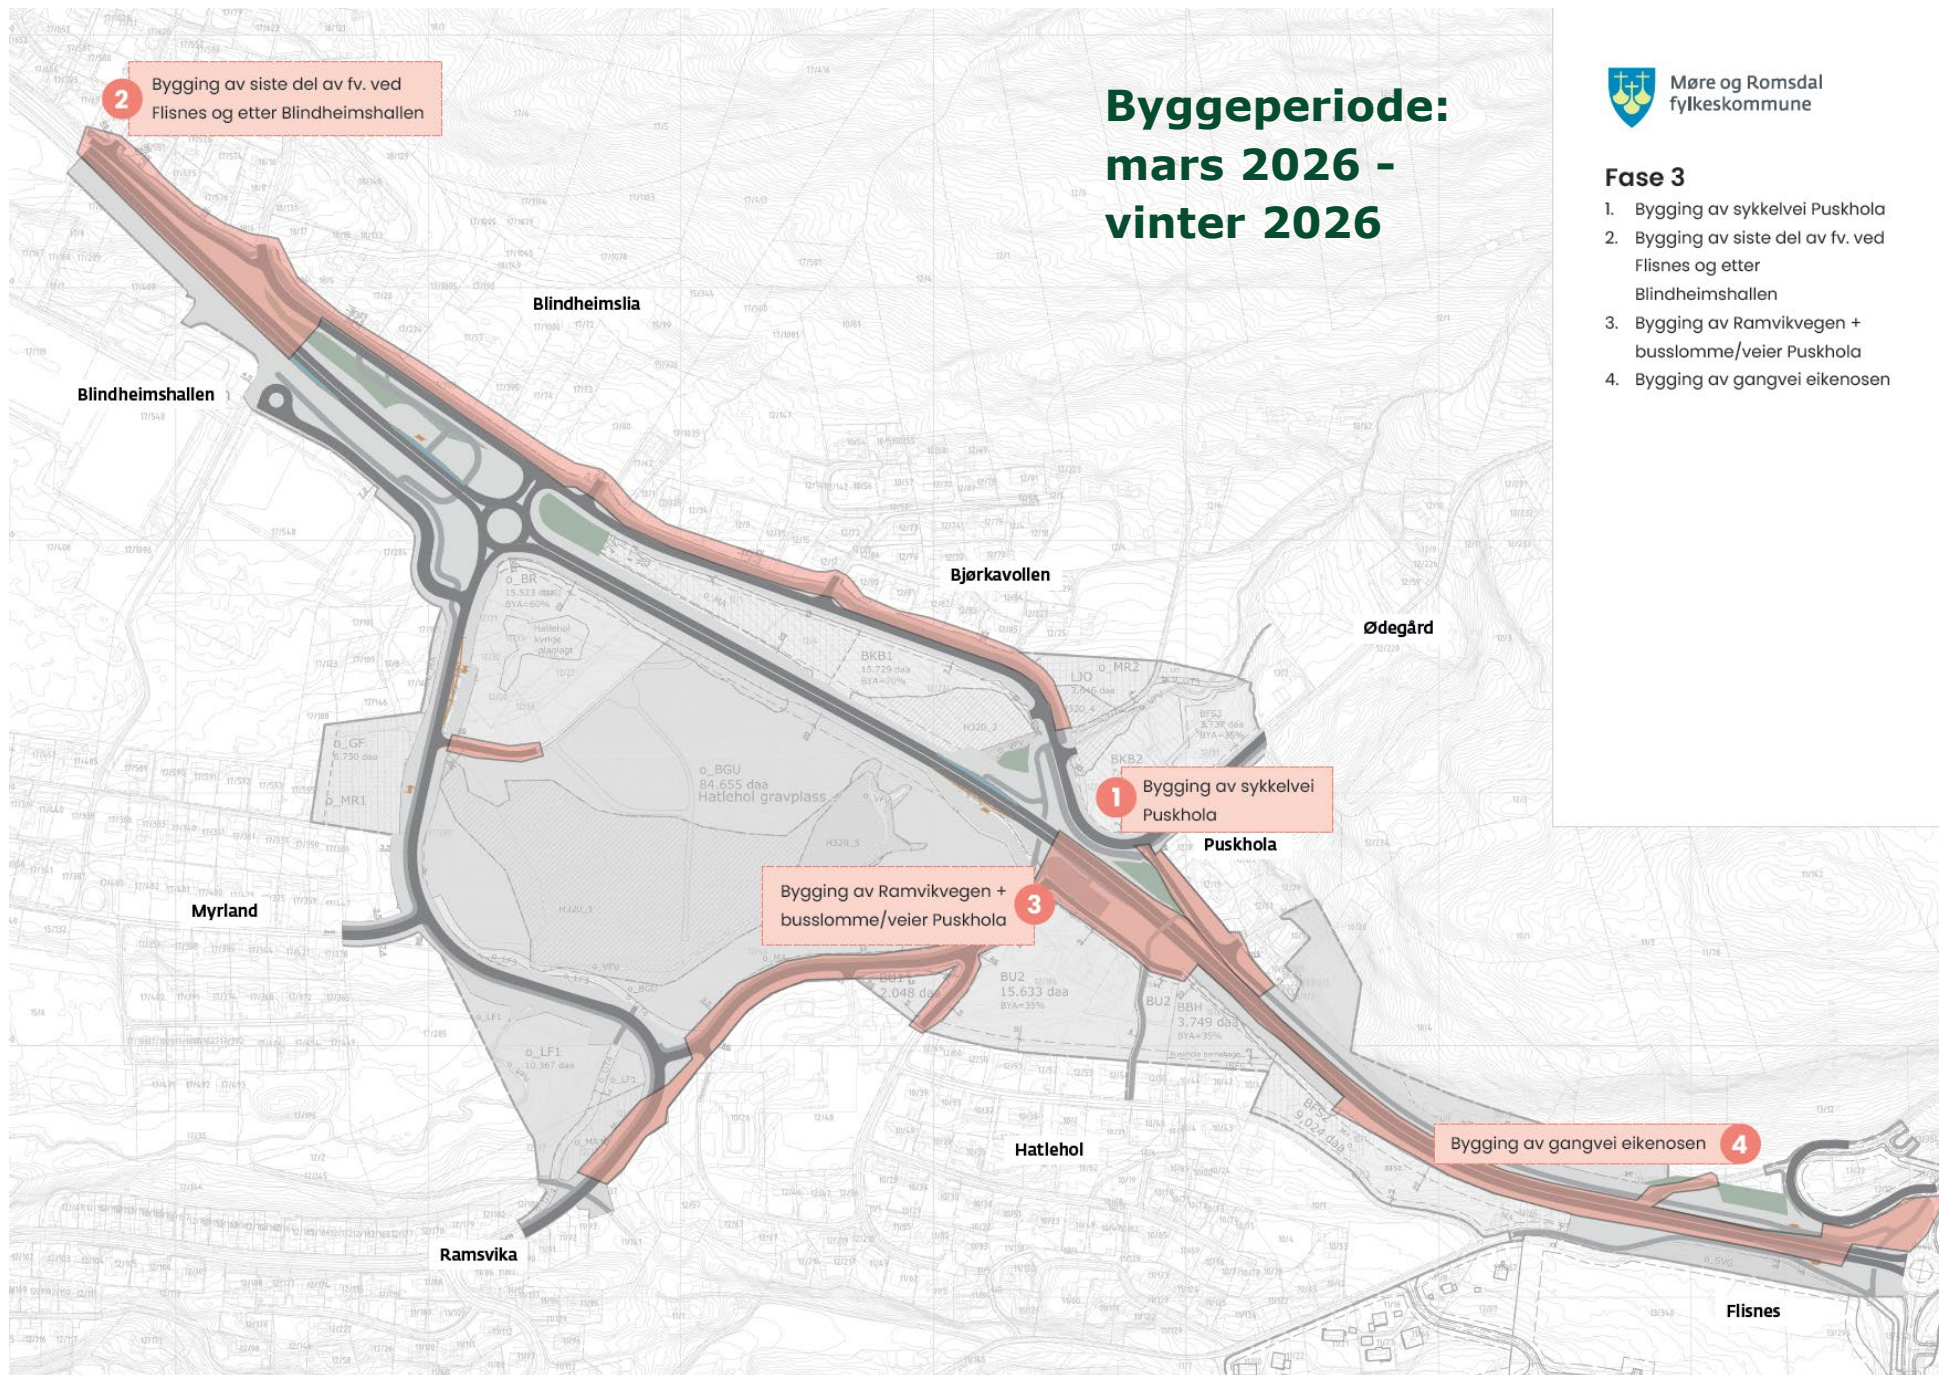




Vinterdrift og trafikkavvikling



Bypakke Ålesund

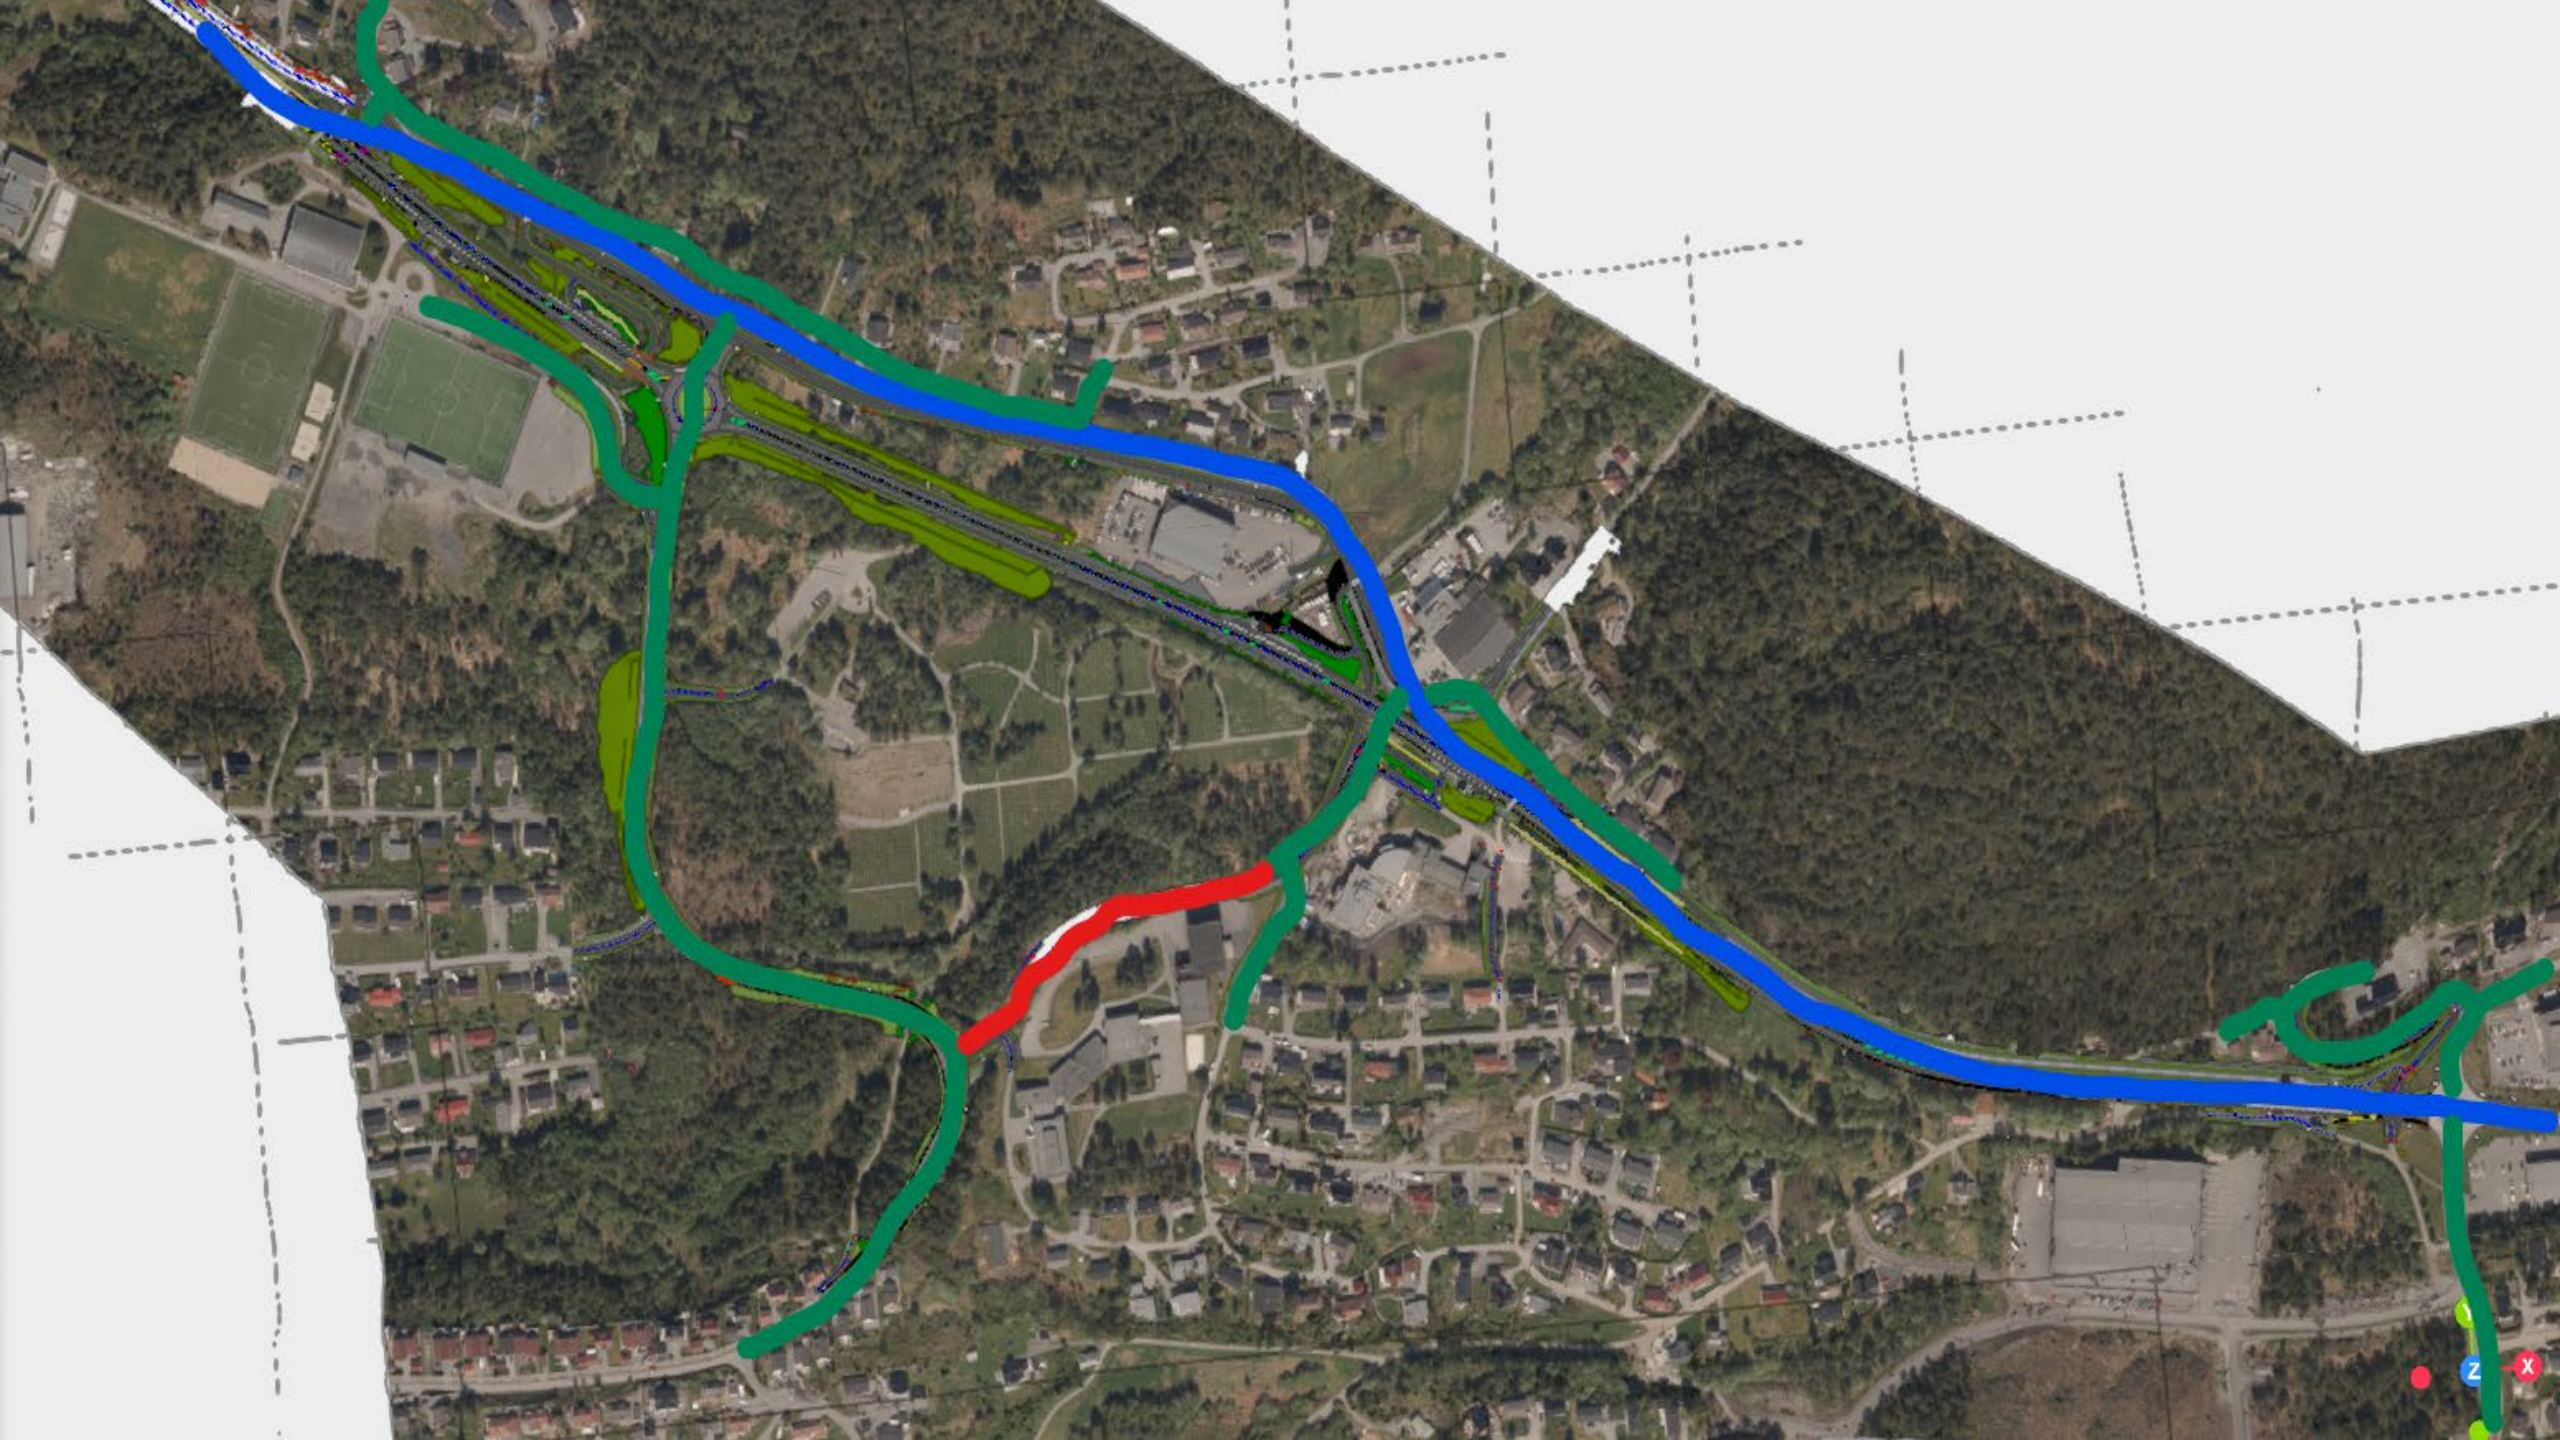

Spørsmål?



Bypakke Ålesund
